

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: NOUVELLE - LES - BOIS
RUE GENERAL PIRON, 1

PROPRIETAIRE: _____

Adresse: _____

DEMANDEUR: CFS RENACLI
BELGRADE

Adresse: _____

INSTALLATEUR: _____

Adresse: _____

TVA ou CI: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Compteur n°: A PLACER
Index: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 01/04/2015 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur) PN

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: HABITATION

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 5x400 V 4w Protection raccordement MAX 40 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 X 16 mm² Inter.gén.: type chiff. 300mA 40A

pe électrode de terre: boucle - barres - piquets conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1+1; Nombre de circuits term.: 20/99; RA: 16 Ohm; RI tot _____ MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: VOIR PLAN EN ANNEXE

1D1 - 1 DIFF 40A 300mA TETRA
1 DIFF 40A 300mA TETRA
1 D155 TETRA 40A
1 D155 TETRA 16A
5 D155 BIPOL 20A
4 D155 BIPOL 16A
6 D155 BIPOL 16A

1D1 - 1 D155 TETRA 30A
1 D155 TETRA 30A
5 D155 BIPOL 40A
2 D155 BIPOL 16A
1 DIFF 40A 300mA

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

→ BON POUR RACCORDEMENT 5x400V 4w MAX 40A

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: _____

le responsable du distributeur

nom: _____

signature: _____

- CONCLUSION** ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 01/04/2015 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'a
(N)

BOC
CAUX




* V E R S L A G - R A P P O R T *


pour Le Directeur,

SA CES RENACLE
AV J ABRAS 24
BELGRADE 5001
TVA 441 447 889

le 01/04/2015
BTVEK
AURELIA

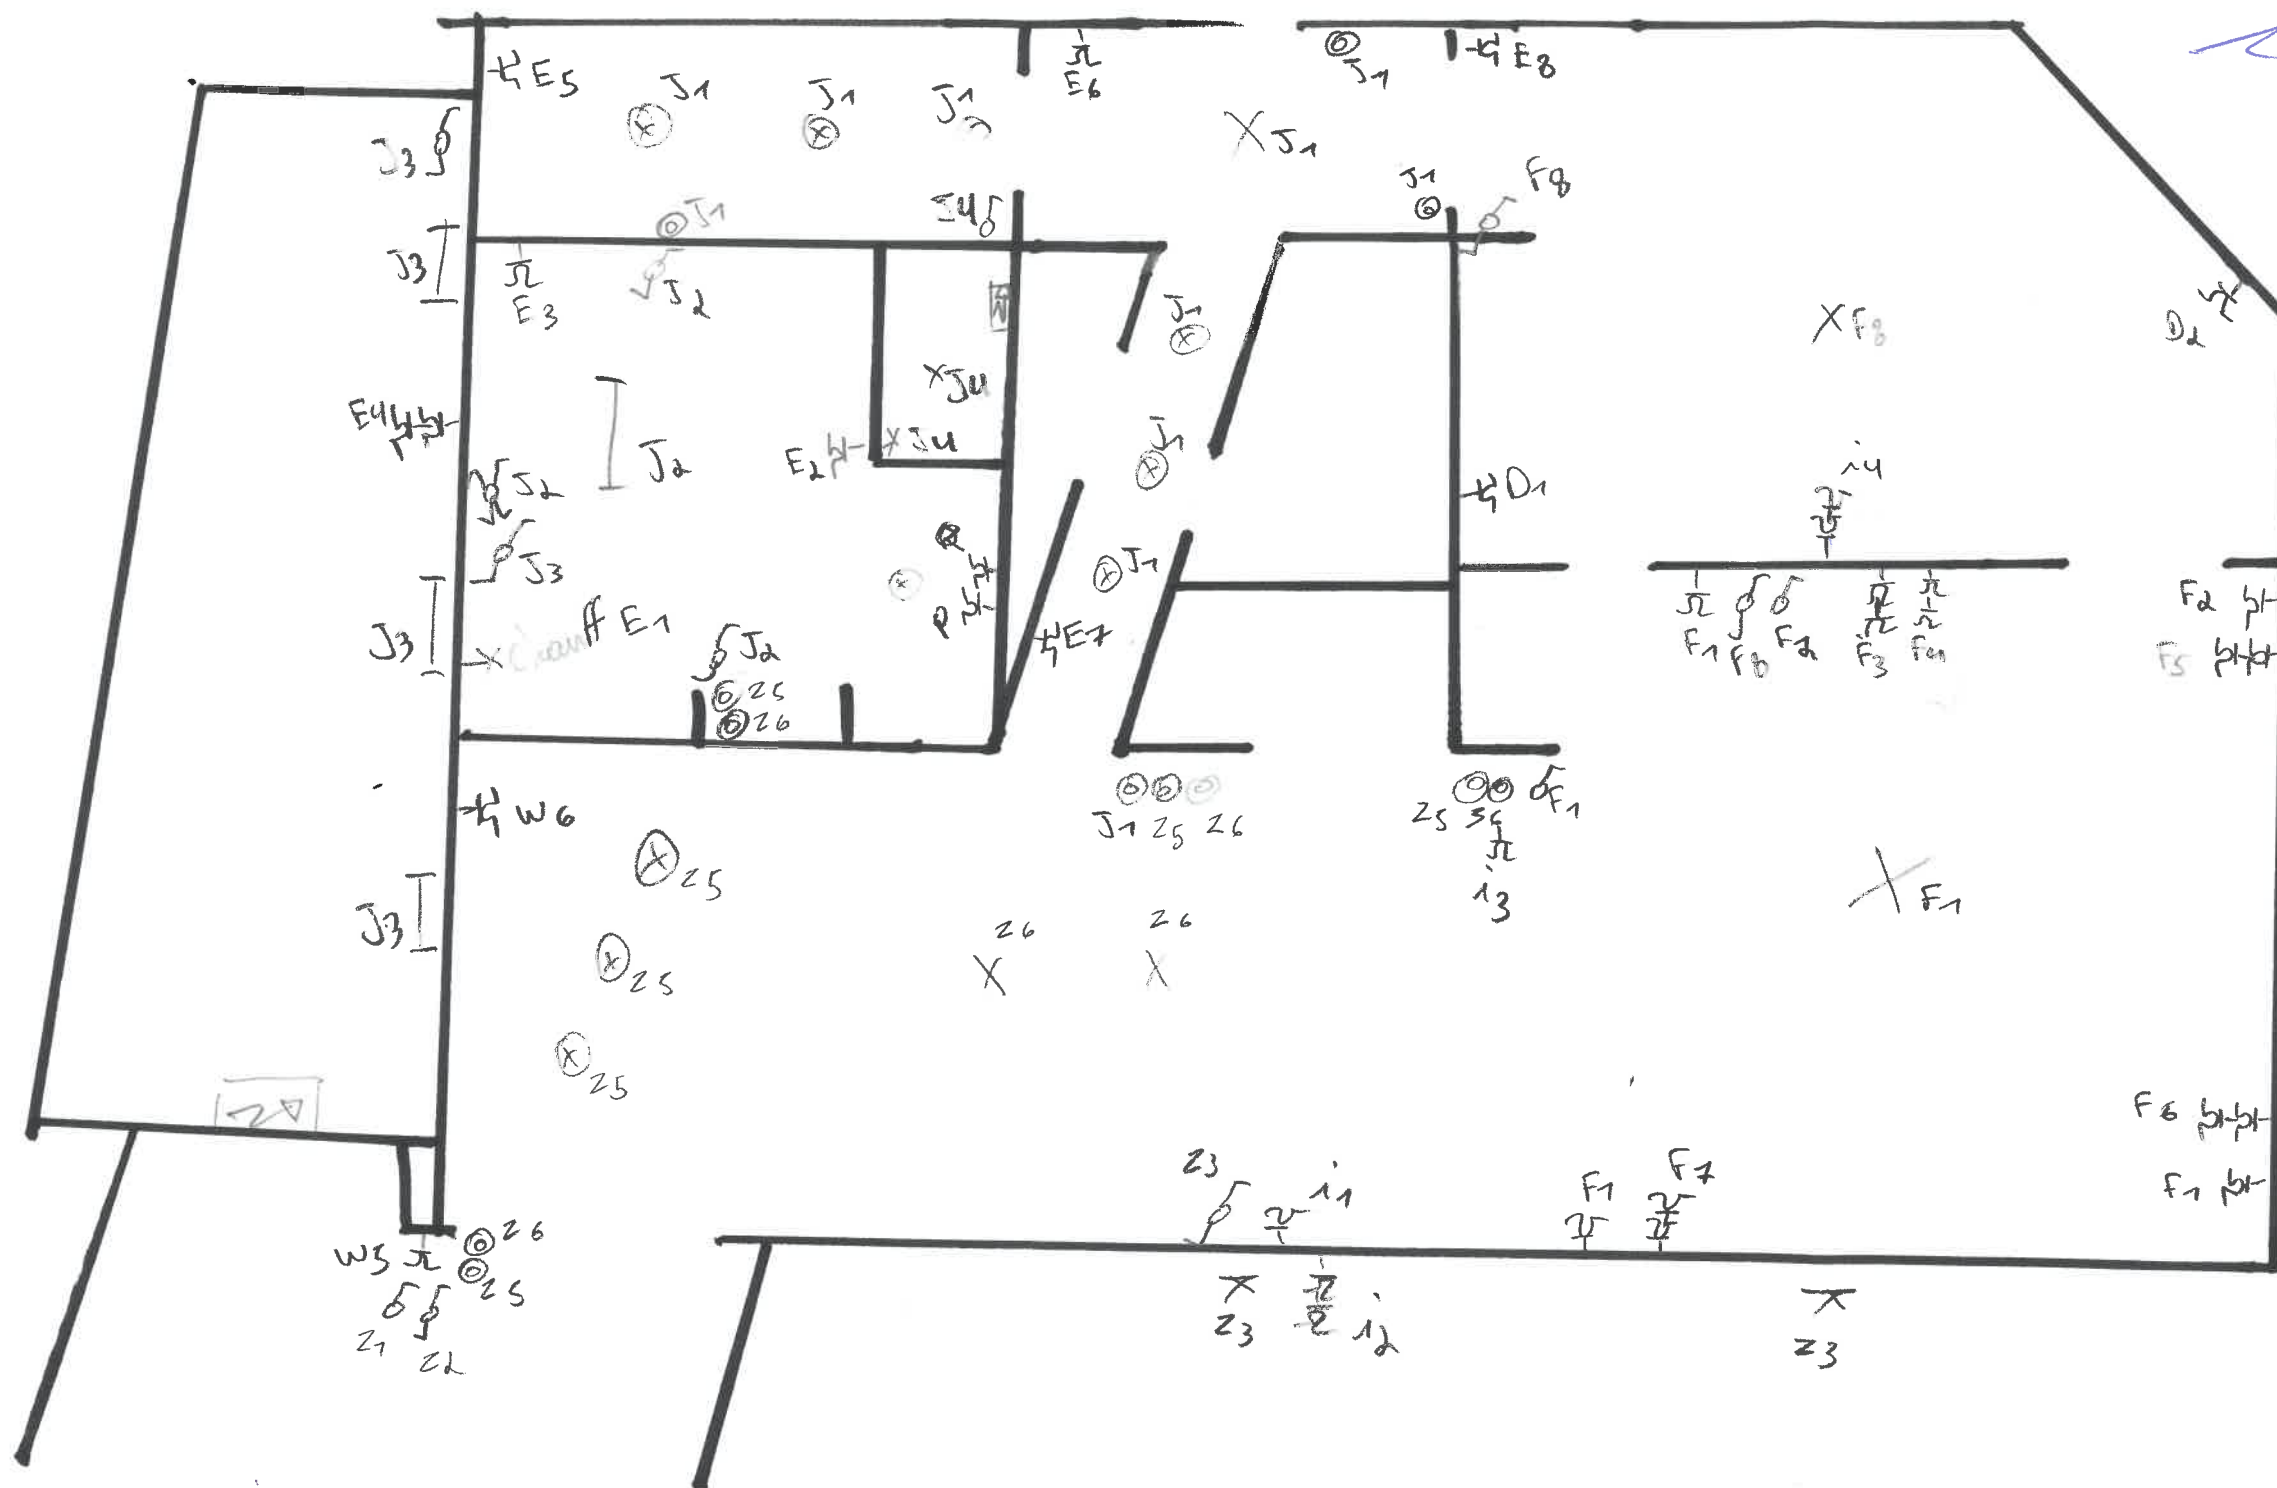

le 01/04/2015
BTV 266
AONBAU2

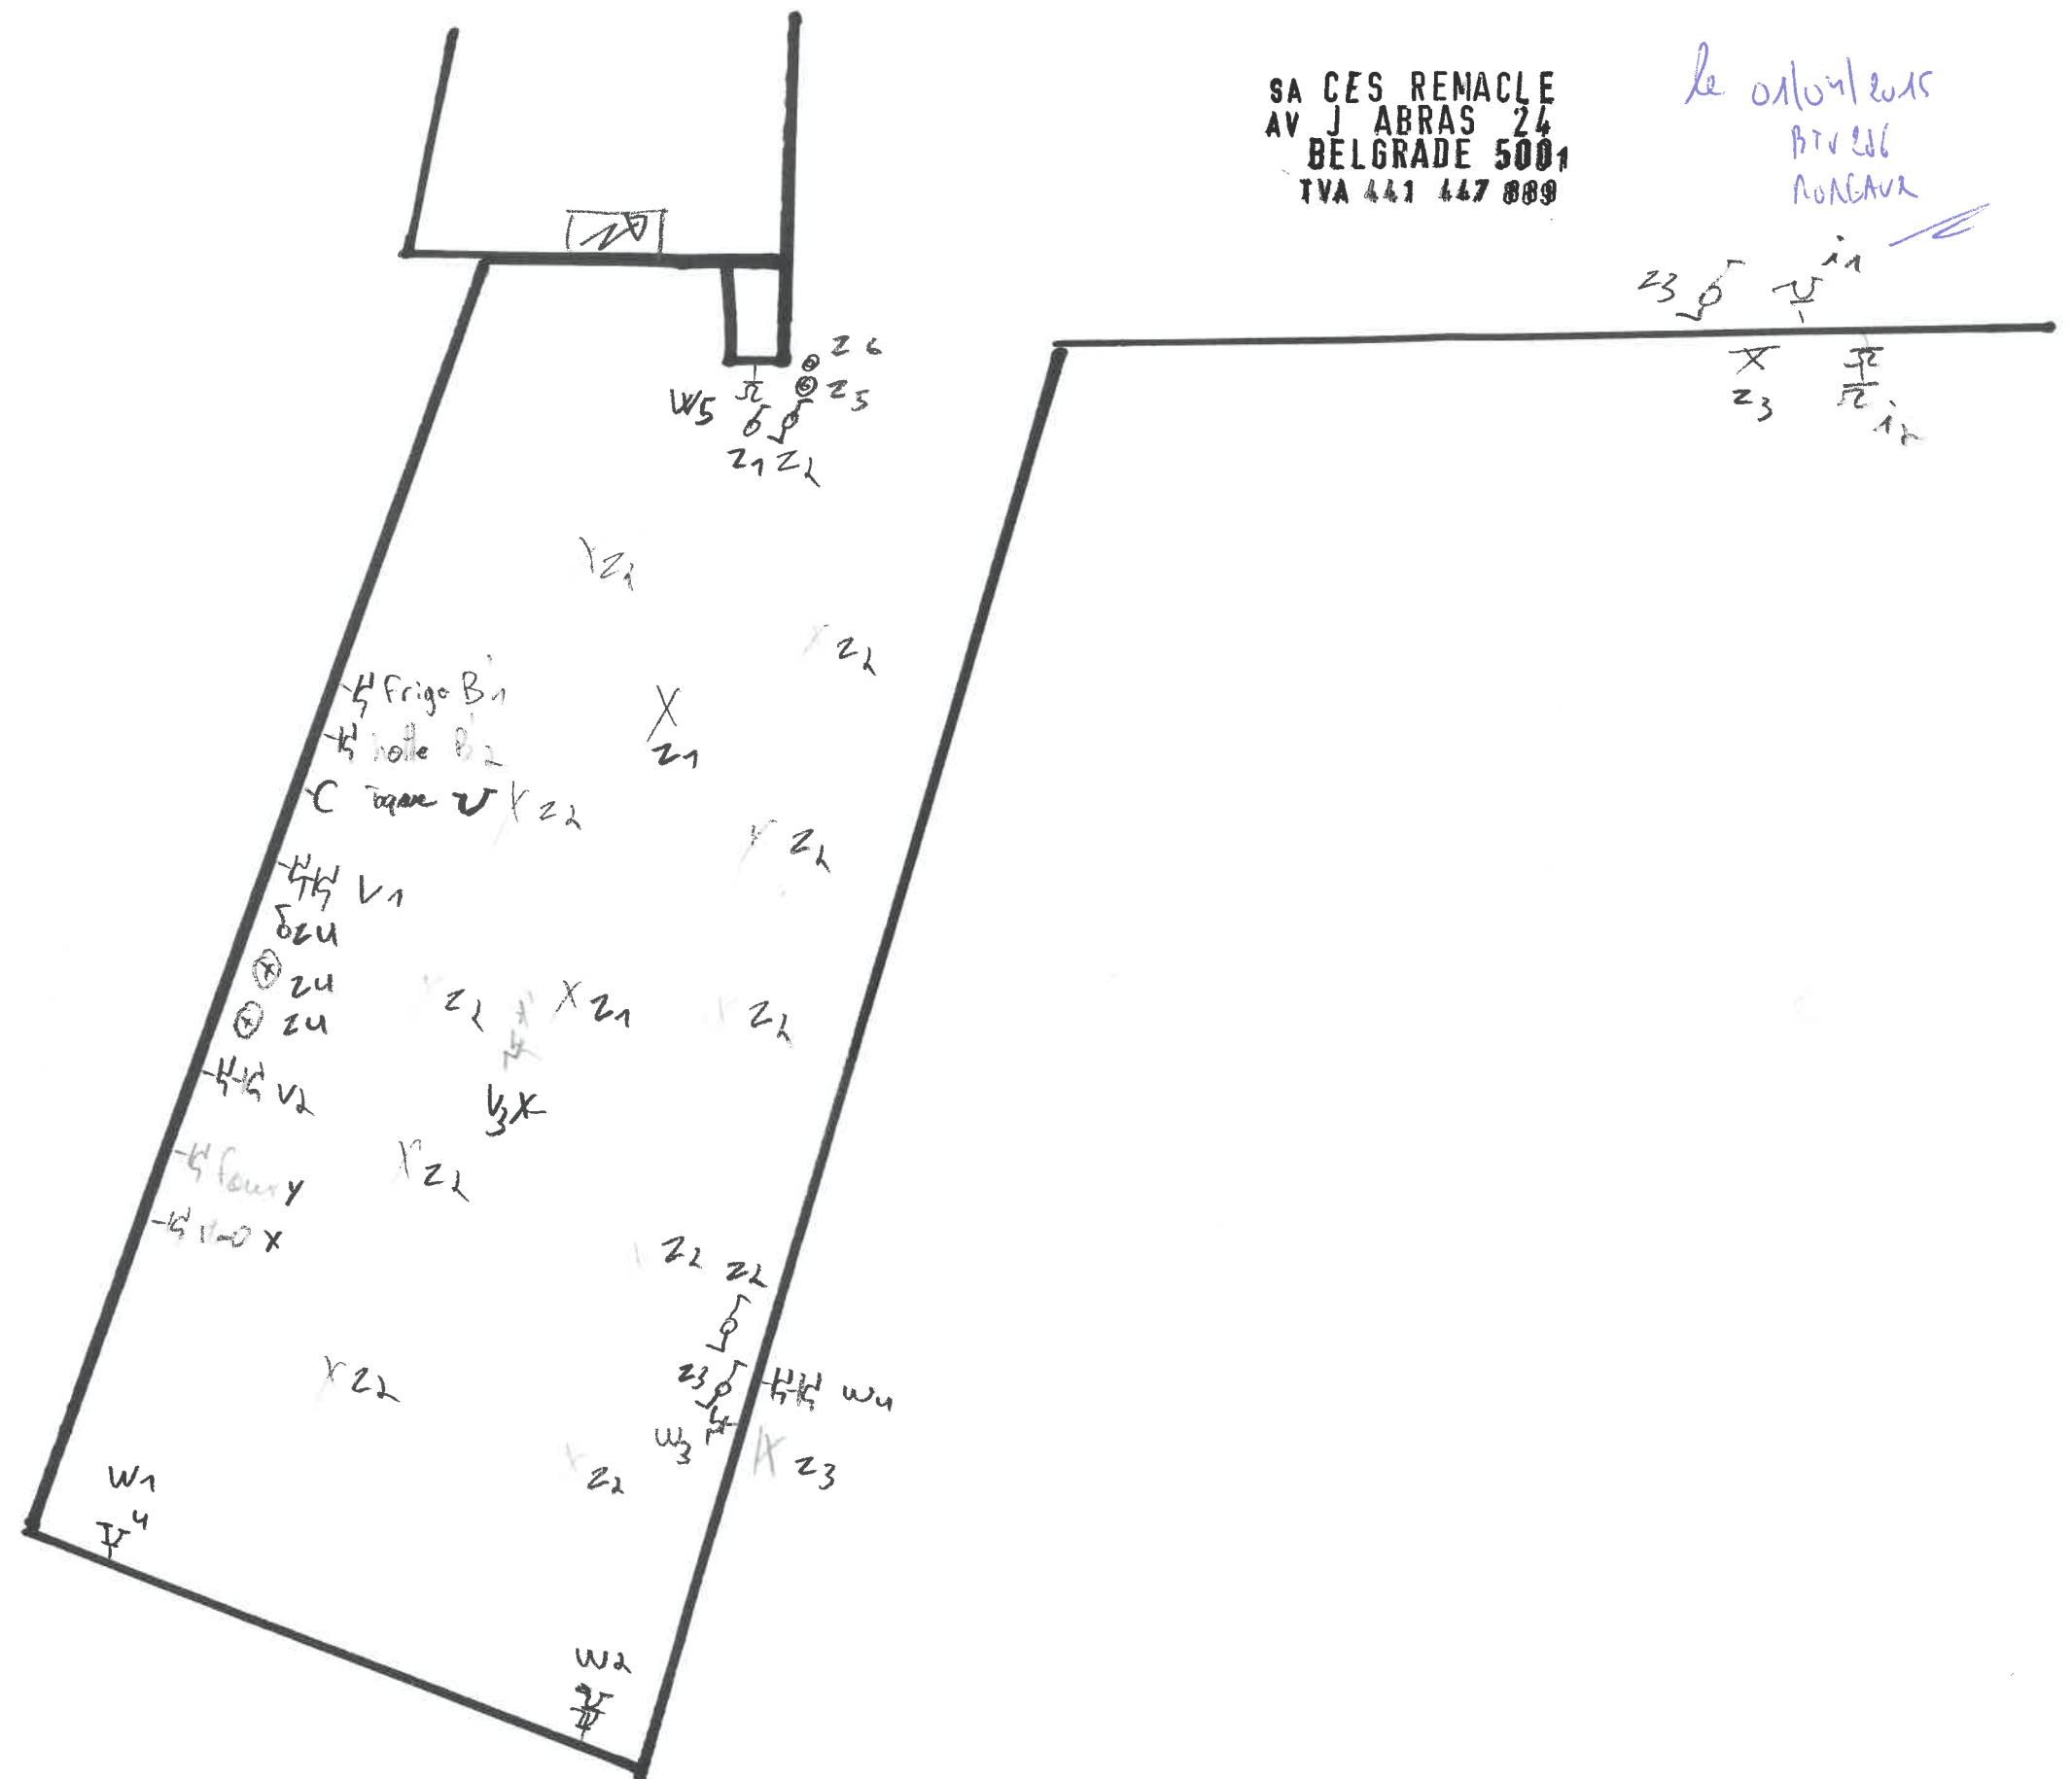

SA CES RENACLE
 AV J ABRAS 24
 BELGRADE 5001
 TVA 441 447 889

le onbulews
 Bivest
 nrcave
 ~

