



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

ONES

Nr teller :

N° comp : 50408387

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 151/121

EAN code: 54144906001439402

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr. ☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

GRAND route 93

5380 HINGEN

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

IDEM

Installateur :

IDEM

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

20/2/2013

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur : BERGHEMANS

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Apart.

Spanning : 400V	Meter / bord verbinding : EXUB 4x10	Max. beveiliging : 40
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : Boucle	Isolatie : 10000 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 6,3 Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 22		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271 bis	278
40	3000	A	Tous		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
40	30	A	Tous		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
 Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK
 Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐
 Raccordements :

Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
 Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Handwritten signature and date: 21/2/13

Besluit / Conclusion

De installatie is niet conform met het AREI en mag niet in dienst gesteld worden. L'installation est non conforme au RGIE et peut être mise en service. De algemene differentieelschakelaar is versgeuld met een leiding met het teken E.T. L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T. Het teken E.T. is niet aanwezig op de installatie. Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

✓ Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 20/2/2013
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
 o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
 La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.


voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐ 18 m	☐	☐	☐	
271 AK ☐		271 HK ☐		
276 AK ☐		271 HK ☐		

ELECTRO-TEST
 Yves BERGHEMANS
 Inspecteur
 yves.berghe@electro-test.be
 02 476 98 54 53

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'entrée dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Vervolg aan achterzijde

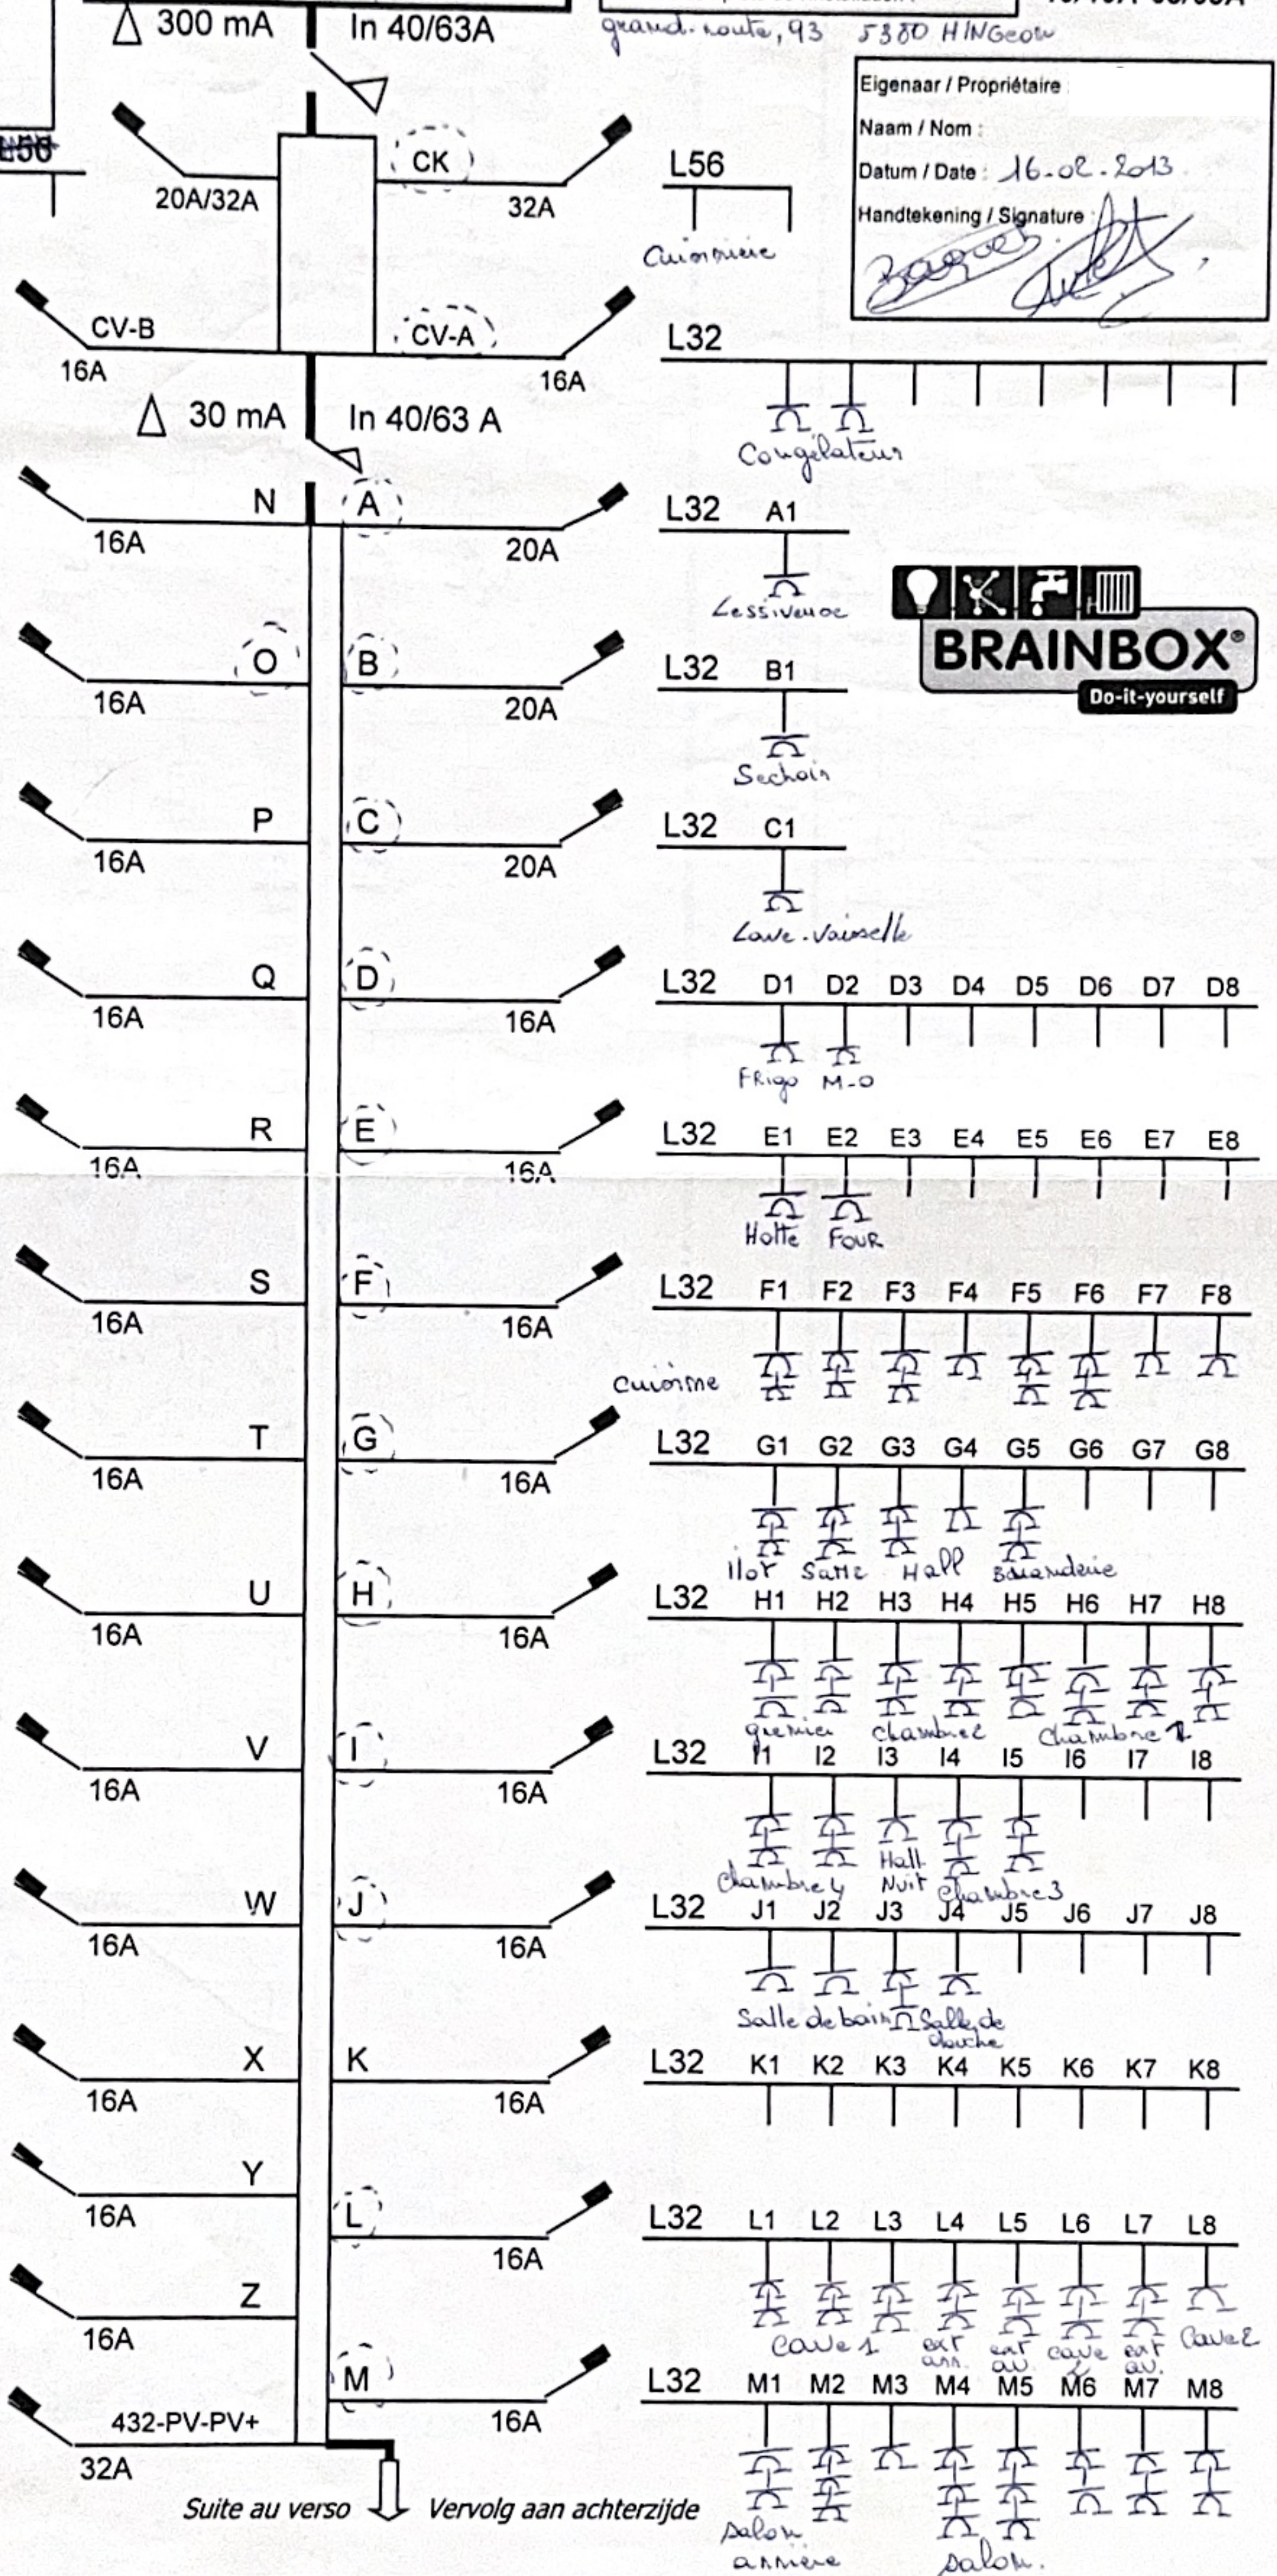

Naam van het erkend organisme :

Délégué de l'organisme agréé :

Handtekening / Signature :

Datum / Date :

Handtekening / Signature :

BRAINBOX®

MULTIVOLTAGE PATENT

L31/L32 : 3 x VOB 1.5 mm²/2.5mm²

L52 : 5 x VOB 2,5mm²

L56 : 5 x VOB 6mm'

Eendraadsschema / Schéma unifilaire :



Volledig adres van de installatie :

Adresse complète de l'installation :

grand-route, 93 5380 HINGEOW

ref. 08-2012

40/40A-63/63A

Eigenaar / Propriétaire :

Naam / Nom :

Datum / Date : 16.02.2013.

Handtekening / Signature

